

Martin Stähli

Von: Bischof Roman <roman.bischof2@anliker.ch>
Gesendet: Montag, 10. März 2025 14:05
An: ms@staehli.ag
Cc: Schnellmann Patrick; Maass Sebastian
Betreff: WG: 250310_LIC_Falken_Termine Steigzone 1_2

Sali Martin

Unten im Mailverlauf (gelb markiert) die Termine für die weiteren Arbeiten an den Vormauerungen. Darf ich dich bitten dies so in dein Programm aufzunehmen?

Besten Dank
Roman

Freundliche Grüsse

Roman Bischof
Projektleiter Hochbau



Anliker AG Bauunternehmung
Tödistrasse 80
8800 Thalwil

Tel. Direkt: +41 44 722 64 57
Tel. Zentrale: +41 44 722 64 64
Mobile: +41 79 469 80 06

roman.bischof2@anliker.ch / www.anliker.ch

Von: Licordari Nathalie <nathalie.licordari@allreal.ch>

Gesendet: Montag, 10. März 2025 13:55


An: Selahattin Atak <s.atak@sutterluetiag.ch>; Kevin Eicher <ke@Eichair.ch>; Nida Kanberi <nk@eichair.ch>; Nikollaj Kolë <kole.nikollaj@roth.ch>; Ryssel Paul <P.Ryssel@kosterag.ch>; Bischof Roman <roman.bischof2@anliker.ch>; Miguel Eiras <M.Eiras@aregger-elektro.swiss>; Maass Sebastian <sebastian.maass@anliker.ch>; s.jud@jada.ch; Tobias Meienberg <T.Meienberg@aregger-elektro.swiss>

Cc: Marco Gasser <mga@boeschag.ch>; Michel Schärli <michel.schaerli@meierhans.ch>; Stefan Rüede <stefan.rueede@meierhans.ch>; Schumacher Bruno <bruno.schumacher@allreal.ch>

Betreff: 250310_LIC_Falken_Termine Steigzone 1_2 [secure] [signed OK]

Werte Damen und Herren

Anbei eine Zusammenstellung über das weitere Vorgehen der Steigzonen 1 + 2 über alle Geschosse, können wir gerne noch am kommenden Mittwoch besprechen:

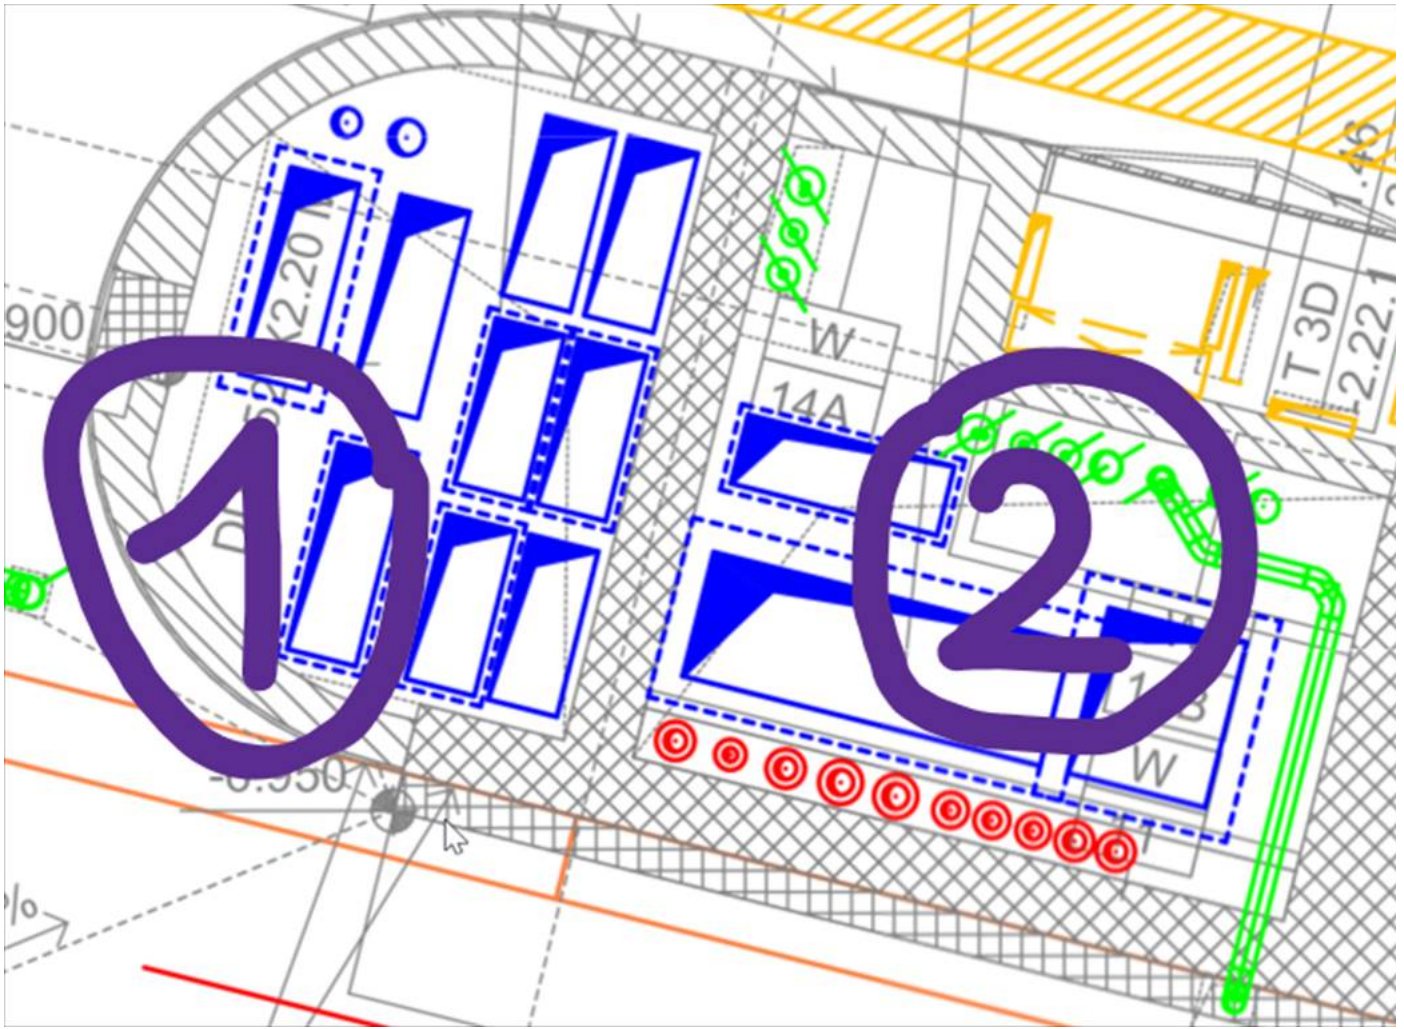

- Steigzone 1:
 - EichAir: Start ab 17.03.2025 alle Geschosse bis rauf ins 4OG. Fertig bis 21.03.2025. Fa. Jada fürs FireShield öffnen und schotten ist auf Montag 17.03.2025 terminiert (in Absprache Jaser).
 - **ABNAHME durch Fachplaner: Freitag 21.03.2025, 14Uhr**
 - Anliker: Mauerwerk EG erstellen in Zusammenarbeit mit Sanitär, Start 24.03.2025
 - Anliker: Mauerwerk rund im 2UG und das fehlende im kleinen WC 1UG kann auch im gleichen Zuge erstellt werden. (Schlussendlich fehlen dann jeweils immer an gleicher Stelle im 2UG/1UG/EG das kleine Mauerstück das die Steigzone 2 abschliesst, dieser Termin ist noch offen)

- Steigzone 2:
 - Koster: alle Leitungen 3UG-1UG sind bereits fertig, inkl. Isolation und Schott
 - Sutterlüti: Sämtliche Leitungen 3UG bis 1UG sind fertigzustellen bis: 20.03.2025 (Inkl. Isolation DURCHGEHEND), Herr Atak bitte mit Fachplaner Gasser alles raschmöglichst klären gemäss Telefon von heute.
 - Roth: Leitungen WD schotten am 21.03.2025 im 3UG und 1UG (Total 2 Stück)
 - EichAir: Start ab 24.03.2025 im EG vor dem Sanitär, danach runter ins 3UG Etagenweise hochkommen, stets in Zusammenarbeit Jada (FireShield) und Roth (normaler Schott), Termine müssen bilateral noch geklärt werden fürs Schotten.
 - Anliker: L-Mauerwerk erstellen am 25.03.2025 (Wunschtermin Allreal, warten auf Rückmeldung Fachplaner wg. Ausführungsart etc)
 - Jada: Löcher öffnen für Sanitär Boden EG am 26.03.2025
 - Sutterlüti: Start im EG nach Lüftung ca. 26.03.2025
 - Aregger: Start Steigzone EG ab 26.03.2025

Freundliche Grüsse

Nathalie Licordari

Allreal-Gruppe

Nathalie Licordari

Dipl. Bauleiter Hochbau / Dipl. Arch. USI/SIA

Bauleitung

Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark

T 044 319 13 03 / M 079 763 88 78

nathalie.licordari@allreal.ch / allreal.ch

[Linkedin](#) / [Instagram](#)

allreal

—
