Schweizerische Nationalbank
Börsenstrasse 15
8001 Zürich

BO15-Terminprogramm
Neuer Fluchtweg FZ-Schleuse

Mit 20.08.25
Rev. 5.0_XCHHI

-vertraulich-
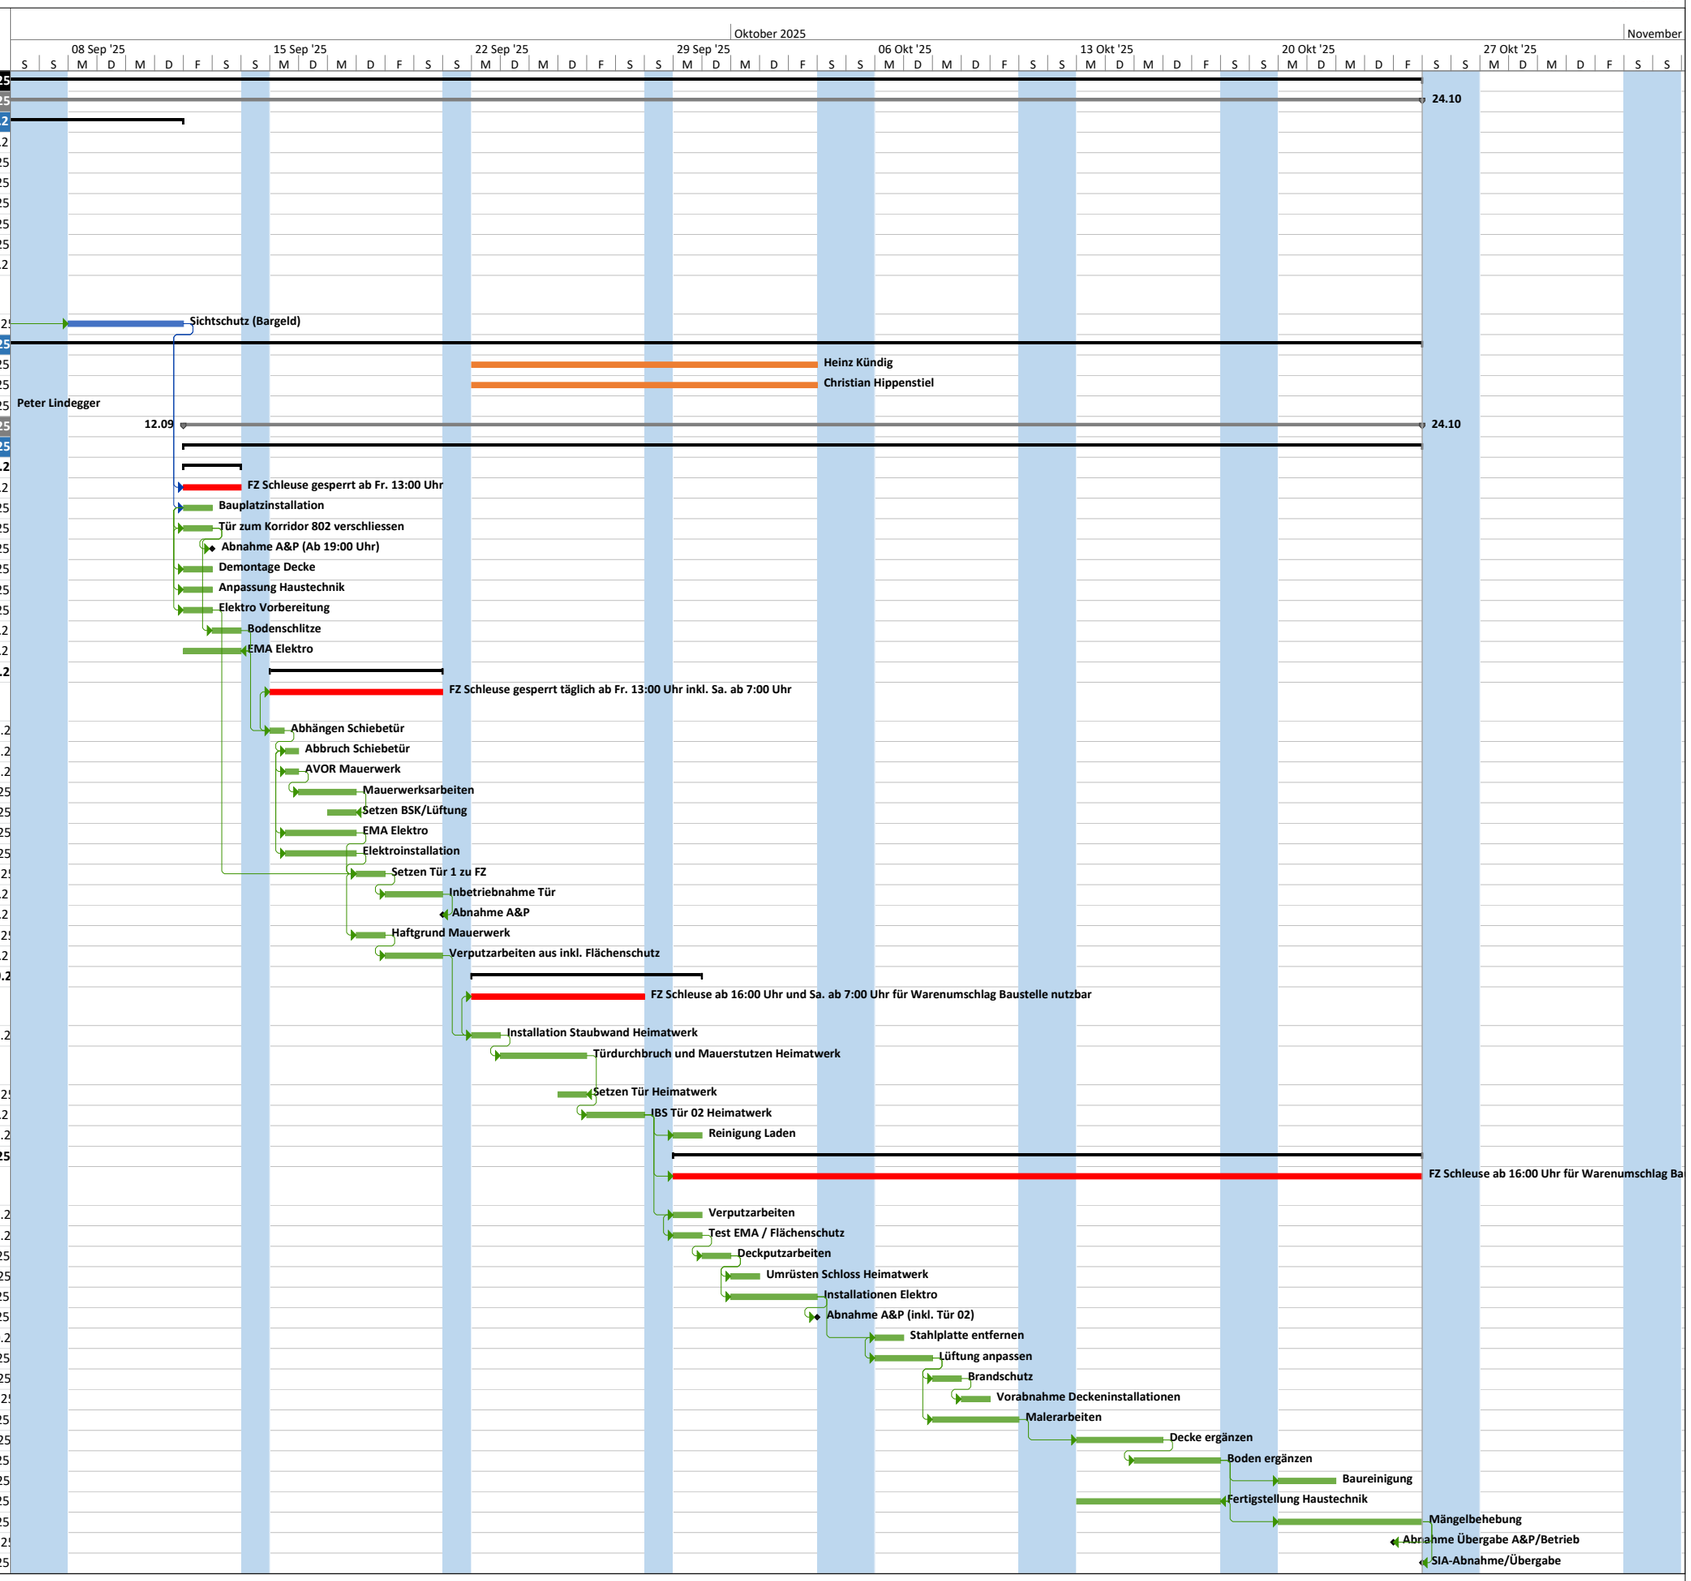
Nr.	Vorgangsname	BKP	Unternehmer	Dauer	Anfang	Ende
1	**SNB BO15 Neuer Fluchtweg FZ- Schleuse**			**196 Tage?**	**Don 30.01.25**	**Fre 24.10.25**
2	**Organisatorisches**			**196 Tage?**	**Don 30.01.25**	**Fre 24.10.25**
3	**Planung, vorgezogene Massnahmen**			**162 Tage**	**Don 30.01.25**	**Don 11.09.2**
4	Sommerferien Zürich			26 Tage	Mon 14.07.25	Sam 16.08.2
5	Vorplanung SNB	SNB	alle	42 Tage	Don 30.01.25	Fre 28.03.25
6	Bestellungen	SNB	XCHHI	5 Tage	Mon 31.03.25	Fre 04.04.25
7	Fertigungsplanung	Unter.	div.	25 Tage	Mon 07.04.25	Fre 09.05.25
8	Produktion	Unter.	div.	40 Tage	Mon 12.05.25	Fre 04.07.25
9	Baustart			0 Tage	Fre 15.08.25	Fre 15.08.25
10	Rack Prov. installieren / im Büro / Sitzungszimm	230	Burkhalter Techni	2 Tage	Fre 15.08.25	Sam 16.08.2
11	Demontage Deckenkomponenten (Licht, Lüftung, BMA) 15. u. 16.8.	230	Burkhalter Technics AG	2 Tage	Fre 15.08.25	Sam 16.08.25
12	Sichtschutz (Bargeld)	SNB	IH-Räume	4 Tage	Mon 08.09.25	Don 11.09.2
13	**Abwesenheiten**			**43 Tage?**	**Mon 01.09.25**	**Fre 24.10.25**
14	Heinz Kündig			11 Tage	Mon 22.09.25	Fre 03.10.25
15	Christian Hippenstiel			11 Tage	Mon 22.09.25	Fre 03.10.25
16	Peter Lindegger			5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25
17	**Bauablauf**			**34 Tage?**	**Fre 12.09.25**	**Fre 24.10.25**
18	**Ausführung**			**34 Tage?**	**Fre 12.09.25**	**Fre 24.10.25**
19	**Etappe 1 (Fr. ab 13:00 Uhr - Sa. 17:00 Uhr**			**2 Tage?**	**Fre 12.09.25**	**Sam 13.09.2**
20	FZ Schleuse gesperrt ab Fr. 13:00 Uhr	SNB		2 Tage	Fre 12.09.25	Sam 13.09.2
21	Bauplatzinstallation	211	De Capitani	1 Tag	Fre 12.09.25	Fre 12.09.25
22	Tür zum Korridor 802 verschliessen	211	De Capitani	1 Tag	Fre 12.09.25	Fre 12.09.25
23	Abnahme A&P (Ab 19:00 Uhr)	SNB	A&P	0 Tage	Fre 12.09.25	Fre 12.09.25
24	Demontage Decke	283	Decken Meyer	1 Tag?	Fre 12.09.25	Fre 12.09.25
25	Anpassung Haustechnik	244	Lufttechnik	1 Tag?	Fre 12.09.25	Fre 12.09.25
26	Elektro Vorbereitung	230	Burkhalter Techni	1 Tag	Fre 12.09.25	Fre 12.09.25
27	Bodenschlitze	211	De Capitani	1 Tag	Sam 13.09.25	Sam 13.09.2
28	EMA Elektro	236.7	Siemens	2 Tage	Fre 12.09.25	Sam 13.09.2
29	**Etappe 2 (Mo. Sa. Ab 13:00 -22:00 Uhr)**			**6 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Sam 20.09.2**
30	FZ Schleuse gesperrt täglich ab Fr. 13:00 Uhr inkl. Sa. ab 7:00 Uhr	SNB		6 Tage	Mon 15.09.25	Sam 20.09.25
31	Abhängen Schiebetür	230	Burkhalter Techni	0.5 Tage	Mon 15.09.25	Mon 15.09.2
32	Abbruch Schiebetür	211	De Capitani	0.5 Tage	Mon 15.09.25	Mon 15.09.2
33	AVOR Mauerwerk	211	De Capitani	0.5 Tage	Mon 15.09.25	Mon 15.09.2
34	Mauerwerksarbeiten	211	De Capitani	2 Tage	Die 16.09.25	Mit 17.09.25
35	Setzen BSK/Lüftung	260		1 Tag	Mit 17.09.25	Mit 17.09.25
36	EMA Elektro	236.7	Siemens	2.5 Tage	Mon 15.09.25	Mit 17.09.25
37	Elektroinstallation	230	Burkhalter Techni	2.5 Tage	Mon 15.09.25	Mit 17.09.25
38	Setzen Tür 1 zu FZ	272	Schneebeli	1 Tag	Don 18.09.25	Don 18.09.2
39	Inbetriebnahme Tür	div.	div	2 Tage	Fre 19.09.25	Sam 20.09.2
40	Abnahme A&P	SNB	A&P	0 Tage	Sam 20.09.25	Sam 20.09.2
41	Haftgrund Mauerwerk	211	De Capitani	1 Tag	Don 18.09.25	Don 18.09.2
42	Verputzarbeiten aus inkl. Flächenschutz	211	De Capitani	2 Tage	Fre 19.09.25	Sam 20.09.2
43	**Etappe 3 (Mo. ab 7:00 Uhr - Sa. 17:00 Uhr**			**7 Tage?**	**Mon 22.09.25**	**Mon 29.09.2**
44	FZ Schleuse ab 16:00 Uhr und Sa. ab 7:00 Uhr für Warenumschlag Baustelle	SNB		6 Tage	Mon 22.09.25	Sam 27.09.25
45	Installation Staubwand Heimatwerk	211	De Capitani	1 Tag	Mon 22.09.25	Mon 22.09.2
46	Türdurchbruch und Mauerstutzen Heimatwerk	211	De Capitani	3 Tage	Die 23.09.25	Don 25.09.25
47	Setzen Tür Heimatwerk	273.0	Schreiner	1 Tag	Don 25.09.25	Don 25.09.2
48	IBS Tür 02 Heimatwerk	230	div.	2 Tage	Fre 26.09.25	Sam 27.09.2
49	Reinigung Laden	287	Gallo	1 Tag?	Mon 29.09.25	Mon 29.09.2
50	**Etappe 4 (Mo.-Fr. 7:00 -17:00 Uhr)**			**20 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Fre 24.10.25**
51	FZ Schleuse ab 16:00 Uhr für Warenumschlag Baustelle nutzbar	SNB		20 Tage	Mon 29.09.25	Fre 24.10.25
52	Verputzarbeiten	211	De Capitani	1 Tag	Mon 29.09.25	Mon 29.09.2
53	Test EMA / Flächenschutz	236.7	HKG	1 Tag	Mon 29.09.25	Mon 29.09.2
54	Deckputzarbeiten	211	De Capitani	1 Tag	Die 30.09.25	Die 30.09.25
55	Umrüsten Schloss Heimatwerk	272	Schneebeli	1 Tag	Mit 01.10.25	Mit 01.10.25
56	Installationen Elektro	230	Burkhalter Techni	3 Tage	Mit 01.10.25	Fre 03.10.25
57	Abnahme A&P (inkl. Tür 02)	SNB	A&P	0 Tage	Fre 03.10.25	Fre 03.10.25
58	Stahlplatte entfernen	211	De Capitani	1 Tag	Mon 06.10.25	Mon 06.10.2
59	Lüftung anpassen	244	Lufttechnik	2 Tage	Mon 06.10.25	Die 07.10.25
60	Brandschutz	227	AE	1 Tag	Mit 08.10.25	Mit 08.10.25
61	Vorabnahme Deckeninstallationen	div.	div.	1 Tag	Don 09.10.25	Don 09.10.2
62	Malerarbeiten	285	Schaub	3 Tage	Mit 08.10.25	Fre 10.10.25
63	Decke ergänzen	283	Decken Meyer	3 Tage	Mon 13.10.25	Mit 15.10.25
64	Boden ergänzen	281	WALO	3 Tage	Mit 15.10.25	Fre 17.10.25
65	Baureinigung	287	Gallo	2 Tage	Mon 20.10.25	Die 21.10.25
66	Fertigstellung Haustechnik	24	div.	5 Tage	Mon 13.10.25	Fre 17.10.25
67	Mängelbehebung	div.	div.	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25
68	Abnahme Übergabe A&P/Betrieb	div.	XCHHI	0 Tage	Don 23.10.25	Don 23.10.2
69	SIA-Abnahme/Übergabe	div.	XCHHI	0 Tage	Fre 24.10.25	Fre 24.10.25
